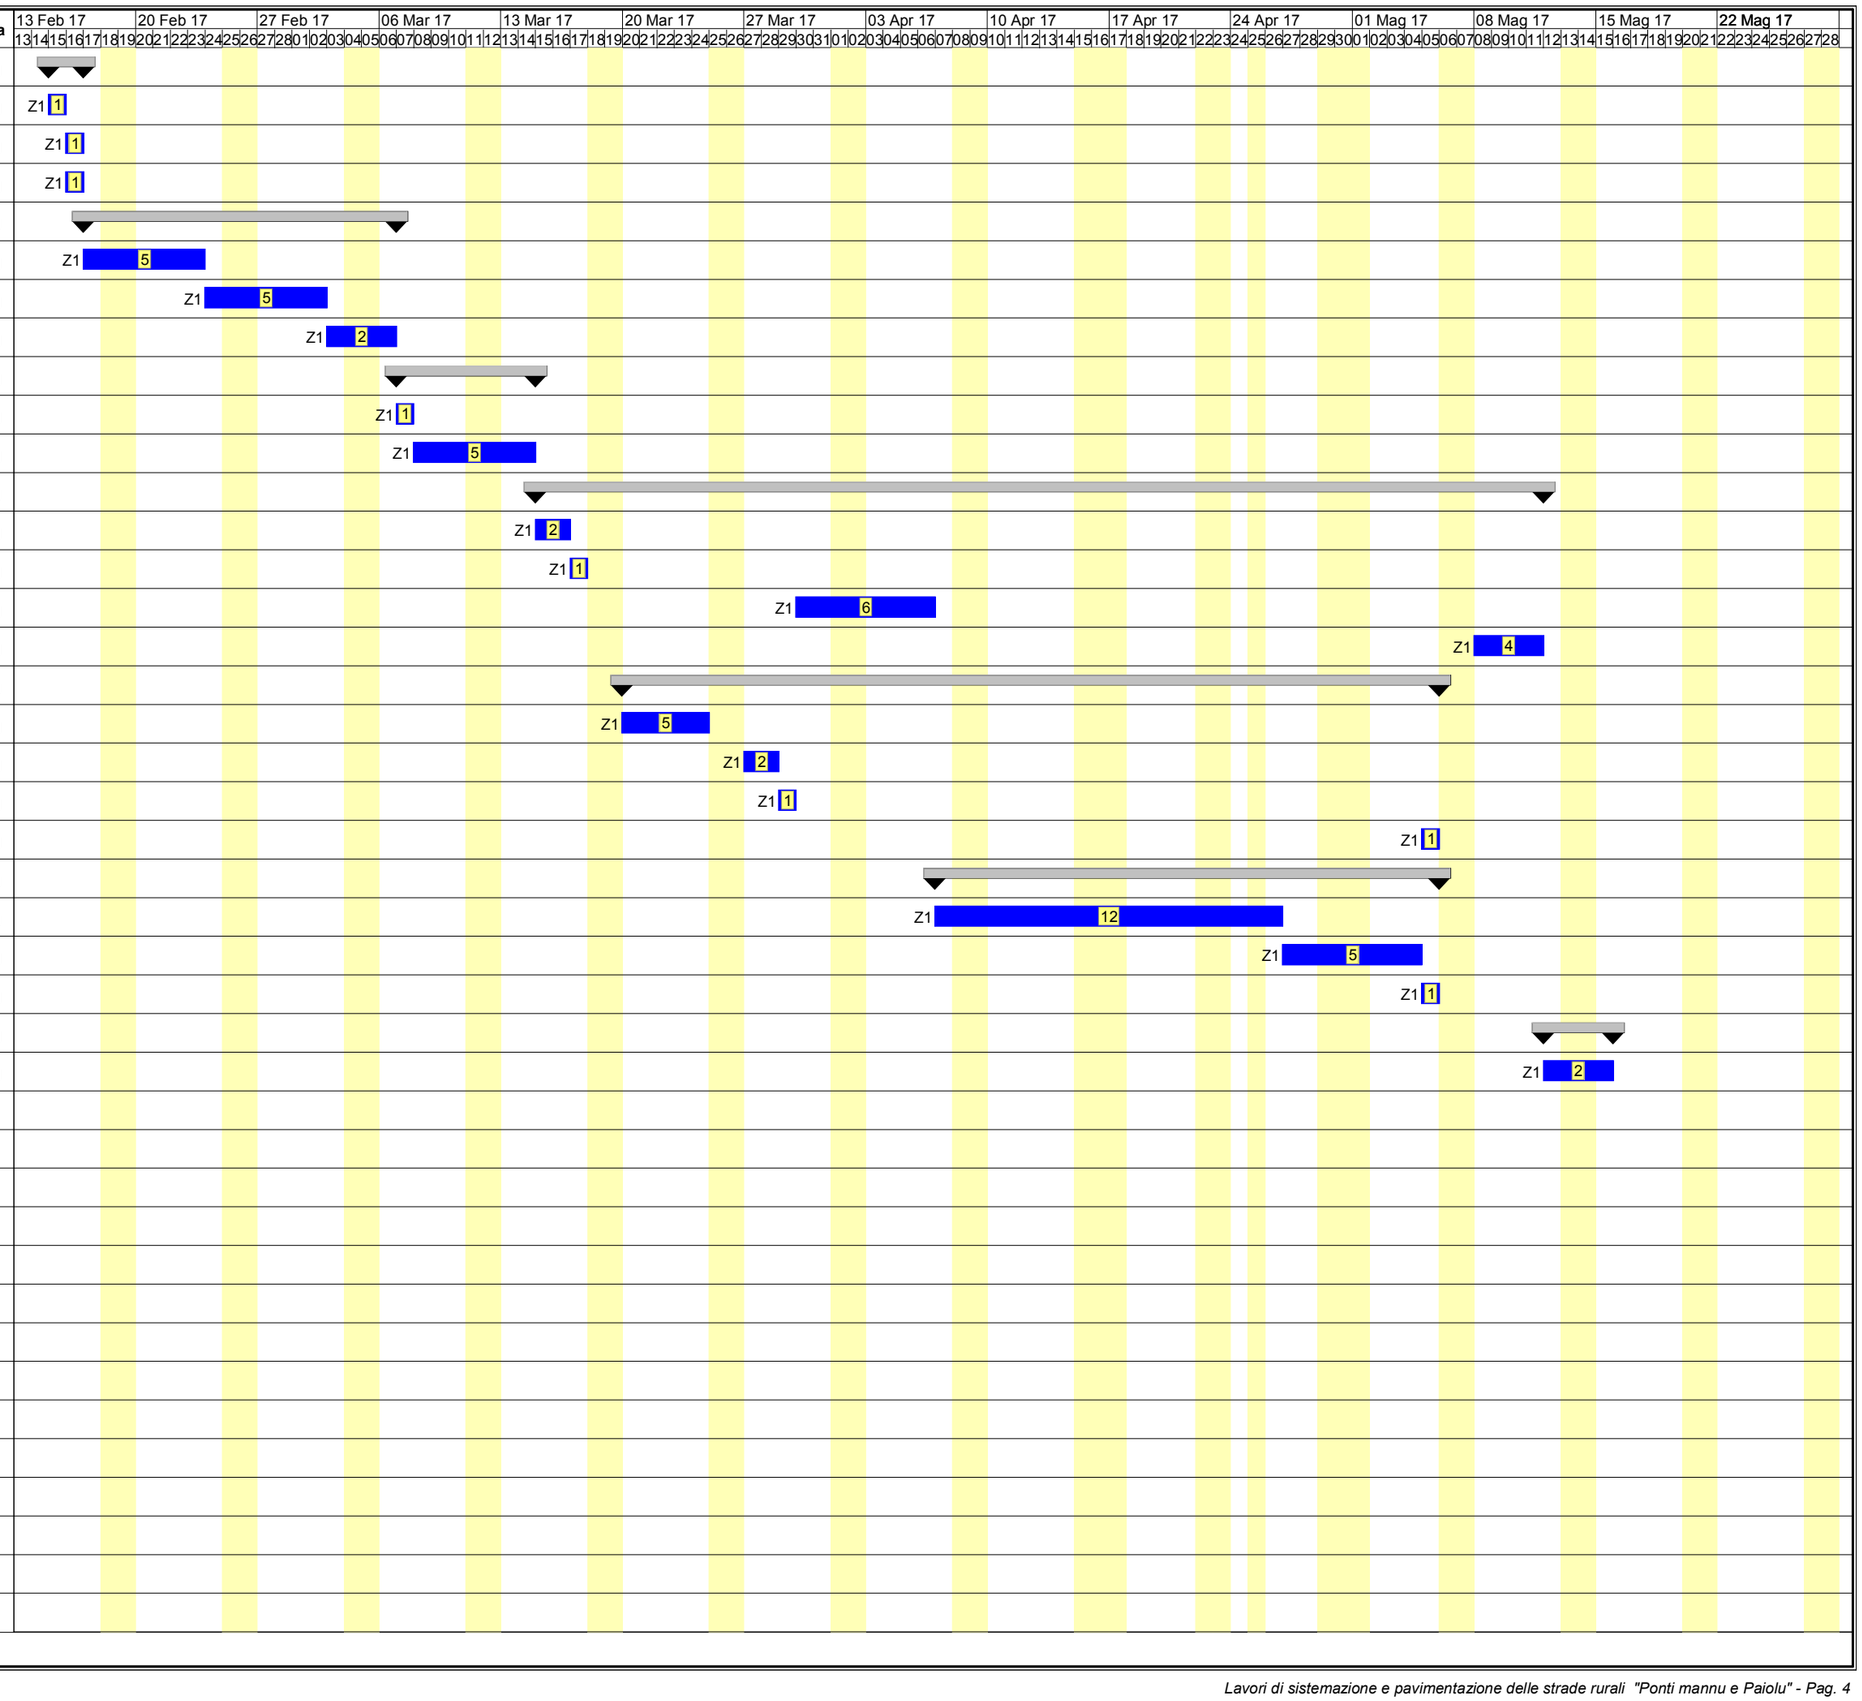Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	2 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
PULIZIA DA ARBUSTI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	12 g
Pulizia delle cunette, delle scarpate e dei cigli	5 g
Demolizione di muro a secco di recinzione	5 g
Rimozione di recinzione metallica	2 g
SCAVI E MOVIMENTO TERRA	6 g
Scavo di sbancamento	1 g
Scavo a sezione ristretta	5 g
LAVORI SEDE STRADALE	39 g
Preparazione del piano viario	2 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Formazione di rilevato stradale	6 g
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g
OPERE D'ARTE IN C.A.	32 g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori	2 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g
Posa di caditoia in ferro per pozzetto	1 g
OPERE COMPLEMENTARI	18 g
Realizzazione di muratura in pietrame	12 g
Posa di recinzione metallica	5 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
